



VEEDURÍA CIUDADANA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Reporte N°3

Vigilancia ciudadana en
establecimientos de salud

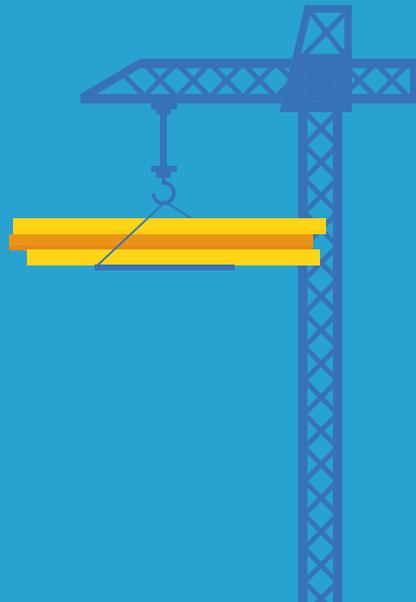

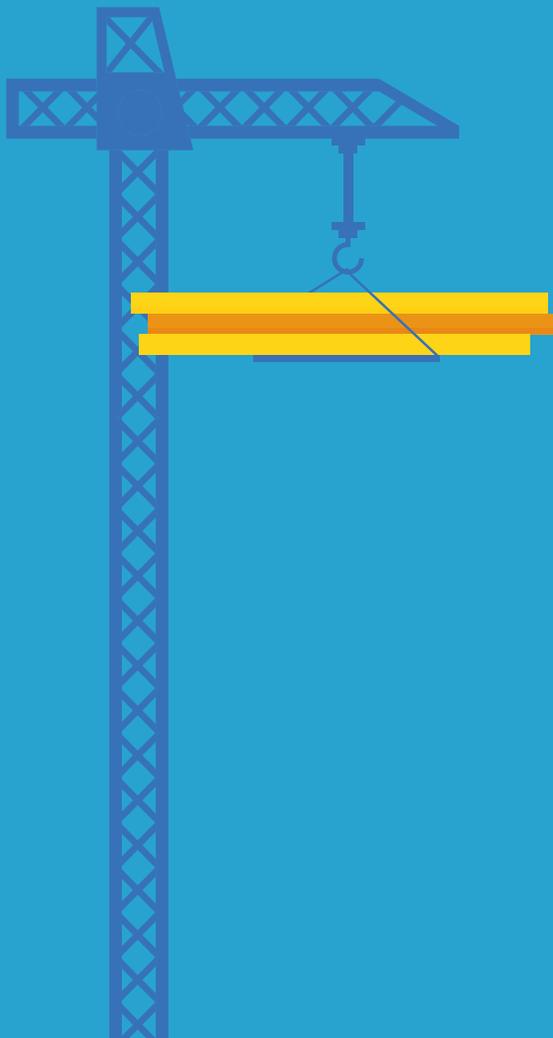



PRESENTACIÓN

Las veedurías ciudadanas de la reconstrucción están integradas por ciudadanos y ciudadanas que, de forma voluntaria, vigilan la ejecución de las obras incluidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Para ello verifican la documentación del proceso de contratación y realizan visitas periódicas a los lugares donde se están trabajando los proyectos. Los resultados de la labor de las veedurías se organizan y difunden a través de reportes periódicos, como el que se presenta en esta oportunidad. En conjunto, la veeduría tiene la finalidad de promover un proceso de reconstrucción eficiente y transparente.


Esta iniciativa es impulsada por una alianza entre el Observatorio de Integridad e instituciones de la sociedad civil en las regiones más afectadas por el Niño Costero. En las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Áncash (Chimbote y Huaraz) se han conformado Comités de Impulso que se reúnen en forma periódica para efectuar un seguimiento del proceso de reconstrucción, organizar la capacitación y acompañar el despliegue de veedores, y analizar los resultados de la veeduría ciudadana.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, a través del

proyecto “Compromiso ciudadano para una reconstrucción transparente”.

En este reporte se presentan los resultados de un operativo especial de veeduría, realizado entre fines de mayo e inicios de junio de 2019, en 47 establecimientos de salud de cinco regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) que fueron afectados por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017. El objetivo de este operativo fue identificar el nivel de avance de las obras de rehabilitación o reconstrucción previstas en el Sector Salud. Para estos establecimientos, que atienden a cerca de 4 mil personas diariamente, se proyecta una inversión superior a los 381 millones de soles.

Las visitas realizadas permitieron apreciar que en la mayoría de establecimientos de salud se ha logrado el restablecimiento de los servicios afectados, pero que son mínimos los avances en materia de reconstrucción de la infraestructura. Las conclusiones y recomendaciones que se encuentran en este reporte han sido presentadas a las entidades vinculadas con el proceso (Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Ministerio de Salud, Contraloría General de la República). El Observatorio de Integridad hará seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas.

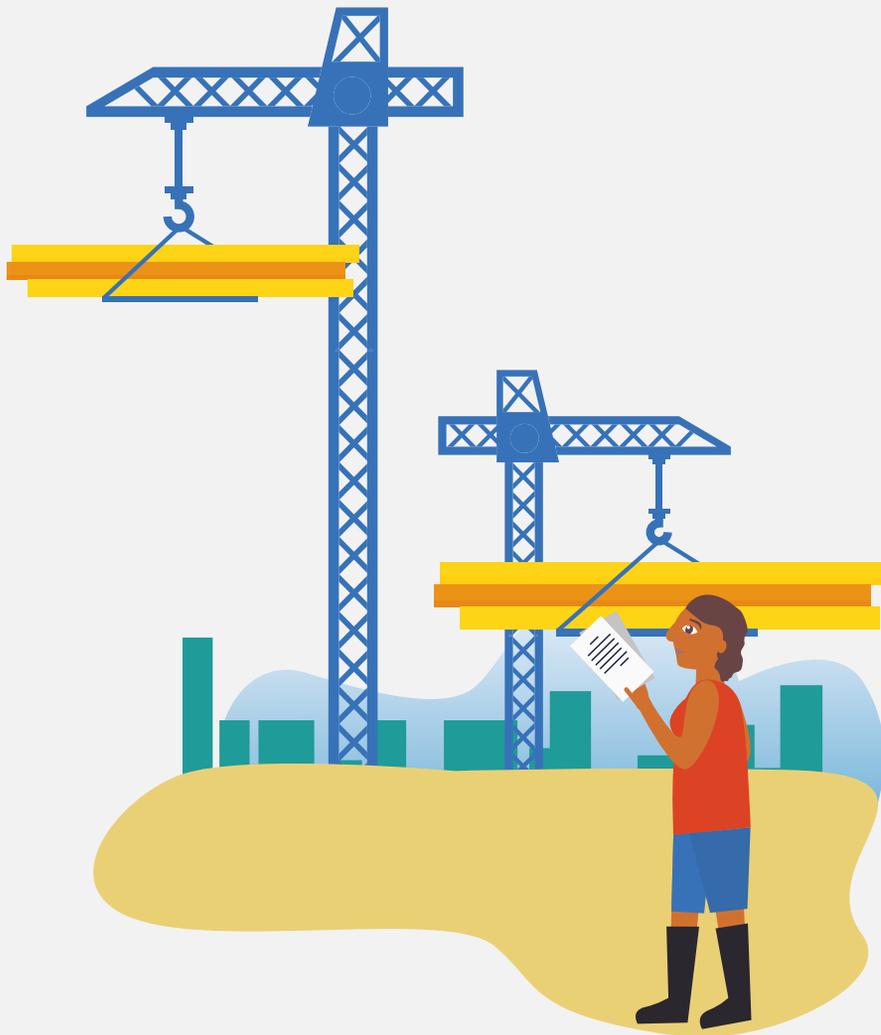

RESUMEN EJECUTIVO

- Entre el 27 de mayo y el 9 de junio, veedores ciudadanos de cinco regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) visitaron 47 establecimientos de salud afectados por el Niño Costero 2017: 9 hospitales, 26 centros de salud y 12 puestos de salud, ubicados en 39 distritos de 23 provincias. El objetivo fue identificar el nivel de avance de las obras de rehabilitación o reconstrucción previstas en el Sector Salud.
- Antes del despliegue, se sostuvo una reunión con funcionarios del Programa Nacional de Infraestructura de Salud, en la cual se conocieron algunas dificultades operativas para la ejecución de obras: (i) modificaciones normativas al procedimiento de contrataciones; (ii) establecimientos ubicados en terrenos sin el debido saneamiento físico legal; (iii) necesidad de expedientes técnicos que adecúen establecimientos antiguos a normas técnicas actuales; y (iv) ausencia de postores en algunos procesos convocados.
- El Niño Costero afectó la provisión de servicios de salud en 32 de los 47 establecimientos visitados. Ello incluye servicios orientados a mujeres, niños y niñas (obstetricia, sala de partos, pediatría, entre otros). En la actualidad, los servicios en su momento interrumpidos han sido restituidos en 26 de los 32 establecimientos de salud visitados. En cuatro, los servicios afectados se mantienen parcialmente operativos, y en otros dos no han vuelto a operar.
- El Niño Costero causó daños en la infraestructura de 42 de los 47 establecimientos visitados. A la fecha, en 40 establecimientos donde se reportaron daños a la infraestructura no se han iniciado obras de reconstrucción. En varios establecimientos se han efectuado reparaciones temporales. El personal de salud entrevistado en casi la totalidad de establecimientos de salud no cuenta con información sobre plazos, cronograma o presupuesto de las obras.
- El Observatorio de Integridad presentó los resultados del operativo a instituciones vinculadas con el proceso de reconstrucción. Representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios informaron que han elaborado un diagnóstico sobre la ejecución de proyectos de reconstrucción en el Sector Salud, y que están implementando sus recomendaciones técnicas: reajustes normativos, cambios de unidad ejecutora, fortalecimiento de capacidades a nivel central y regional, y un acompañamiento más cercano.

OPERATIVO ESPECIAL DE VEEDURÍA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Entre el 27 de mayo y el 9 de junio los comités de veedores de cinco regiones (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) desarrollaron un operativo especial de veeduría a establecimientos de salud que fueron afectados por el Fenómeno del Niño Costero del año 2017. El objetivo de este operativo fue identificar el nivel de avance de las obras de rehabilitación o reconstrucción previstas en el Sector Salud. Este reporte presenta la información obtenida en el operativo realizado.

Con este propósito, los Comités de Impulso de las regiones señaladas organizaron visitas a 47 establecimientos de salud (34% de los establecimientos de salud ubicados en esas regiones, y 30% del total de establecimientos incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios). Estos establecimientos incluyeron 9 hospitales, 26 centros de salud y 12 puestos de salud, los cuales se encuentran ubicados en 39 distritos, de 23 provincias en los cinco departamentos mencionados.

REGIÓN	HOSPITAL	CENTRO DE SALUD	PUESTO DE SALUD	TOTAL
Áncash	7	8	5	20
La Libertad	1	7	2	10
Lambayeque	-	6	2	8
Piura	-	4	-	4
Tumbes	1	1	3	5
TOTAL	9	26	12	47



El presupuesto asignado a la reconstrucción de todos estos establecimientos supera los 381 millones de soles, lo cual representa el 34% de la inversión prevista en estas cinco regiones (o el 28% del presupuesto total de reconstrucción para el Sector Salud). Según la información proporcionada por personal de Salud, en los establecimientos visitados se atiende a cerca de cuatro mil personas diariamente.

REGIÓN	Nº	INVERSIÓN PREVISTA (S/.)	PROMEDIO DE PACIENTES ATENDIDOS
Áncash	20	288'332,000	1,747
La Libertad	10	37'272,000	860
Lambayeque	8	19'792,000	526
Piura	4	15'296,000	420
Tumbes	5	21'072,000	403
TOTAL	47	381'764,000	3,956

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.

REUNIÓN INFORMATIVA CON EL PRONIS

El 22 de mayo, antes de iniciar el despliegue previsto en este operativo, integrantes del equipo de Transparencia se reunieron con el Jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción, del Programa Nacional de Infraestructura de Salud (PRONIS) y un integrante de su equipo. En esta reunión, se presentó el proyecto "Compromiso ciudadano para una reconstrucción transparente" y se explicaron los alcances del operativo de veeduría en establecimientos de salud. En el diálogo se pudo conocer que, de los 156 establecimientos de salud incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, 144 están a cargo del PRONIS y los otros 12 a cargo de gobiernos subnacionales.

Respecto a los avances de la reconstrucción de establecimientos de salud, el funcionario entrevistado informó que en el primer semestre de 2018 se realizaron inspecciones técnicas, pero los procesos iniciados con ellas se vieron interrumpidos por las modificaciones normativas realizadas aprobadas a mediados de 2018, cuya finalidad fue agilizar el procedimiento de contrataciones. A consecuencia de estos cambios, según lo informado, los procesos tuvieron que reiniciarse.

Por otro lado, se informó de un conjunto de dificultades operativas que han limitado el

avance en la ejecución de las obras en el Sector Salud. Entre estas dificultades se mencionaron las siguientes:

- Algunos establecimientos de salud se ubican en terrenos que no cuentan con el debido saneamiento físico legal. Esta situación retrasa especialmente la instalación de contingencias (módulos), paso inmediato a la intervención del espacio donde se rehabilitará o reconstruirá infraestructura afectada.
- Algunos establecimientos son antiguos, por lo que su infraestructura no cumple con las normas técnicas actuales. Esto implica la realización de estudios técnicos para determinar los cambios que se requieren para ajustar la infraestructura a la normativa vigente. Esta situación está contemplada en los nuevos procesos iniciados.
- En quince procesos convocados bajo la modalidad concurso oferta (para igual número de establecimientos) no se presentaron postores.

Como resultado de este diálogo, se acordó mantener un canal de comunicación para compartir los resultados del operativo e informar sobre posibles situaciones irregulares que levanten los grupos de veedores.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD VISITADOS

.....


Afectación y restablecimiento de servicios de salud

Según la información recabada, el Fenómeno del Niño Costero 2017 afectó el normal funcionamiento de algunos servicios o áreas en 32 de los 47 establecimientos visitados (68%). En otros 15 establecimientos de salud no se reportó o no se pudo constatar este tipo de problemas (32%).

32
establecimientos
afectados

15
establecimientos
no afectados / sin
información

32%

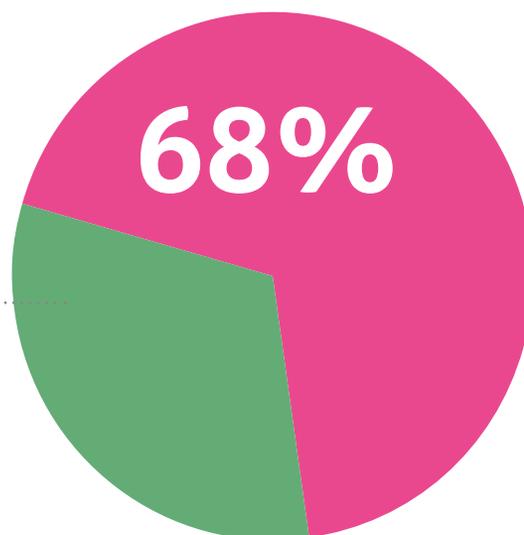

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud.
Elaboración: Observatorio de Integridad.

Un dato importante es que en varios establecimientos de salud el Niño Costero afectó la continuidad de servicios orientados a la salud de mujeres, niños y niñas. Así, en 12 de ellos se reportó una interrupción del servicio de obstetricia, en 9 se afectó la operatividad de la sala de partos, y en 4 el servicio de pediatría o de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED).

Se constató que, en la actualidad, los servicios en su momento interrumpidos han sido restituidos en 26 de los 32 establecimientos de salud donde se informó la afectación de algún área o servicio de salud (81%). En cuatro Centros de Salud los servicios afectados se mantienen parcialmente operativos: Pariacoto (Huaraz), Moro (Santa), Quiruvilca (Santiago de Chuco) y Salas (Lambayeque). Y en otros dos establecimientos los servicios afectados no han vuelto a operar: Puesto de Salud La Tranca (Ferreñafe) y Centro de Salud Zarumilla (Zarumilla).

14





Establecimientos afectados en Castilla, Piura y en Áncash.

REGIÓN	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ÁREAS / SERVICIOS AFECTADOS POR EL NIÑO COSTERO 2017	ESTADO ACTUAL DE LAS ÁREAS O SERVICIOS DE SALUD		
		RESTABLECIDOS	PARCIALMENTE RESTABLECIDOS	INOPERATIVOS
Áncash	16	14	2	-
La Libertad	5	4	1	-
Lambayeque	4	2	1	1
Piura	4	4	-	-
Tumbes	3	2	-	1
TOTAL	32	26	4	2

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.

.....


Daños y reconstrucción de infraestructura en establecimientos de salud

Se constató que el Fenómeno del Niño Costero ocasionó daños de distinto tipo en la infraestructura de 42 de los 47 establecimientos visitados (89%). No se reportaron afectaciones a la infraestructura o no se obtuvo información respecto a los daños sufridos en un total de 5 establecimientos (11%).

42
establecimientos
afectados

5
establecimientos
no afectados / sin
información

11%

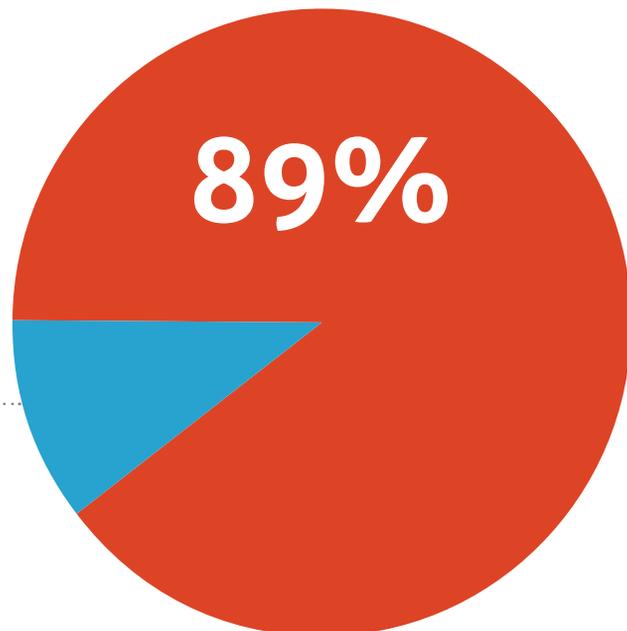

A la fecha, se constatan pocos avances en la reconstrucción de la infraestructura dañada. Los comités de veedores ciudadanos encontraron que en 40 de los 42 establecimientos donde se reportaron daños a la infraestructura (95%) no se han iniciado obras de reconstrucción. En cambio, se encontró que hay obras concluidas en el Centro de Salud Pariacoto (Ancash), y un obra paralizada en el Centro de Salud Zarumilla (Tumbes).

También se encontró que en varios establecimientos de salud se han efectuado reparaciones temporales, empleando recursos distribuidos a causa de la emergencia, o presupuesto de mantenimiento del Ministerio de Salud o fondos propios de los gobiernos locales. Estos arreglos han permitido reacondicionar ambientes para continuar prestando los servicios correspondientes, pero no constituyen aún una rehabilitación integral de la infraestructura afectada.

REGIÓN	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL NIÑO COSTERO 2017	ESTADO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN		
		CONCLUIDA	PARALIZADA	NO INICIADA
Áncash	17	1	-	16
La Libertad	9	-	-	9
Lambayeque	8	-	-	8
Piura	4	-	-	4
Tumbes	4	-	1	3
TOTAL	42	1	1	40

Fuente: Fichas de visita a establecimientos de salud. Elaboración: Observatorio de Integridad.

.....

Información sobre los proyectos de reconstrucción

Los proyectos de reconstrucción de todos los establecimientos de salud visitados están a cargo del PRONIS, salvo en tres Centros de Salud que serán ejecutados por el Gobierno Regional de Piura.

El personal entrevistado en casi la totalidad de establecimientos de salud no contaba con información sobre los plazos o cronograma de ejecución de las obras. En la mayoría de casos,

tampoco contaban con información sobre presupuesto o valorización de los proyectos. En algunos casos, los funcionarios indicaron que recibieron visitas del personal del PRONIS, en las que se recabó información sobre las afectaciones y se efectuaron mediciones. La interrupción de estas visitas parece deberse al ya mencionado reinicio de los procesos por el cambio normativo ocurrido a mediados de 2018.



Veedores ciudadanos entrevistando a personal de salud en Chulucanas, Piura

PRESENTACIÓN PRELIMINAR DEL REPORTE

El viernes 19 de julio, el Observatorio de Integridad organizó una mesa de trabajo para presentar y analizar los resultados del operativo a representantes de distintas instituciones vinculadas con el proceso de reconstrucción¹. Las alertas planteadas en el reporte presentado coincidieron con las preocupaciones expresadas por los y las asistentes a esta reunión.

El espacio sirvió también para que los funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informaran sobre algunas decisiones adoptadas para dinamizar la ejecución de los proyectos de reconstrucción en general, y del Sector Salud en particular. Así, se mencionó que la actual gestión está apostando por un proceso de desconcentración para mejorar la relación con las autoridades subnacionales. Esta

apuesta se traduce en la creación de oficinas desconcentradas, con la posibilidad de revisar expedientes de obras en las mismas regiones (y no en Lima), y en un acompañamiento más cercano a gobiernos regionales y municipalidades.

Respecto al Sector Salud, los representantes de la ARCC informaron que han elaborado un diagnóstico sobre la ejecución de proyectos de reconstrucción, el cual contiene un conjunto de recomendaciones técnicas, entre las cuales se cuentan: reajustes normativos para superar dificultades presentadas en la ejecución; clasificación de los proyectos (rehabilitación, reconstrucción parcial, reconstrucción total) para determinar las unidades ejecutoras que deben encargarse de las obras, lo cual implicará el cambio de unidad ejecutora para 48 establecimientos de salud; presupuesto adicional para el fortalecimiento de capacidades en el diseño y ejecución de proyectos en el nivel central; creación de unidades funcionales especializadas en los Gobiernos Regionales de Piura y Ancash para atender los proyectos de reconstrucción (no solo los de Salud); y un acompañamiento más cercano a las unidades ejecutoras en la formulación de expedientes y en el proceso en general.

1. Asistieron representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, incluyendo su Director Ejecutivo Adjunto, el Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. También participaron organizaciones de la sociedad civil (Asociación Civil Transparencia, Proética, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Grupo Propuesta Ciudadana).

Esta información fue valorada positivamente en la reunión, pues se reconoce que las obras en el Sector Salud son importantes y su avance ha sido lento. En el diálogo quedaron anotadas algunos temas que resultan críticos y necesarios de atender:

- Es fundamental que el PRONIS y la ARCC publiquen y difundan información sobre el estado actual y las previsiones para la ejecución de obras en establecimientos de salud. La información contribuye a modular las expectativas existentes y a perfilar mejor la vigilancia ciudadana.
- Hay que prestar especial atención a la resolución de los “cuellos de botella” identificados, en especial los relacionados a procedimientos de contratación, al saneamiento físico legal de los terrenos donde están ubicados los establecimientos de salud, y a la real capacidad de gestión de estos proyectos por parte de las entidades subnacionales. Cualquiera de estos temas puede constituirse en un obstáculo si no son atendidos con una visión compartida por las instituciones a cargo.

El sábado 20 de julio, un día después de la reunión, se publicó en el diario El Peruano la Resolución Ministerial N° 652-2019/MINSA, mediante la cual se aprueba la modificación del Manual de Operaciones del PRONIS, “excluyendo [de esta entidad] a la Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción”. En su lugar, el Ministerio de Salud creará la Unidad Funcional: Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción con Cambios, bajo el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, la cual asumirá la cartera de proyectos en este campo. Esta decisión es motivada por “la necesidad de dar flexibilidad y celeridad a la ejecución de las intervenciones consideradas en el Plan [Integral] de Reconstrucción con Cambios”.

RECOMENDACIONES

.....

Al Programa Nacional de Infraestructura en Salud²:

1. Organizar y difundir en la página web institucional información sobre el cronograma de ejecución de los proyectos de reconstrucción de establecimientos de salud, estableciendo con claridad las metas anuales, los recursos comprometidos, la unidad ejecutora a cargo, los contratistas seleccionados para la ejecución de las obras, y los avances en la ejecución física y presupuestal.
2. Informar a los responsables de los establecimientos de salud incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios sobre los proyectos previstos, incluyendo información sobre cronograma, recursos y etapas del proceso.
3. Disponer en forma prioritaria, en coordinación con los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, las acciones necesarias para acelerar el saneamiento de los terrenos donde se ubican los establecimientos de salud a fin de agilizar la construcción de los mismos y no retrasar las obras de reconstrucción.

2. Estas recomendaciones podrán ser asumidas por la Unidad Funcional: Unidad de Gestión de Inversiones de Reconstrucción con Cambios, cuando esta se haya conformado..

.....

Al Ministerio de Salud

4. Realizar las acciones necesarias para restablecer los servicios parcialmente interrumpidos en los Centros de Salud Pariacoto (Huaraz), Moro (Santa), Quiruvilca (Santiago de Chuco) y Salas (Lambayeque), así como aquellos que se encuentran inoperativos en el Puesto de Salud La Tranca (Ferreñafe) y el Centro de Salud Zarumilla (Zarumilla).
5. Disponer la publicación en las vitrinas de los establecimientos de salud incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, de la información que proporcione el PRONIS (ver recomendación 2) sobre la ejecución de obras de reconstrucción.



Establecimiento
afectado en Carhuaz,
Áncash.

.....

A la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

6. Evaluar la incorporación del Centro de Salud El Molino (distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, La Libertad) en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
7. Evaluar, en coordinación con el PRONIS y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, las razones que han motivado que convocatorias a obras de reconstrucción en el Sector Salud hayan quedado desiertas, y proponer las modificaciones normativas o procedimentales para garantizar que nuevos procesos concluyan con el otorgamiento de la buena pro.
8. Realizar, en cumplimiento de sus funciones de supervisión y control de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, un monitoreo de la ejecución presupuestaria de las obras del Sector Salud, y difundir el análisis efectuado con las recomendaciones que correspondan.




Establecimiento
afectado en Cascas,
La Libertad.

INFORMACIÓN DETALLADA POR REGIONES

Se menciona en primer lugar los servicios afectados e infraestructura dañada por el Fenómeno del Niño Costero 2017, incluyendo precisiones sobre el estado actual de los mismos. El nivel de riesgo que se menciona fue determinado a partir de la observación efectuada en los locales visitados y, donde fue posible, en diálogo con los funcionarios entrevistados. En algunos casos se añaden observaciones adicionales recogidas por los equipos de veedores.



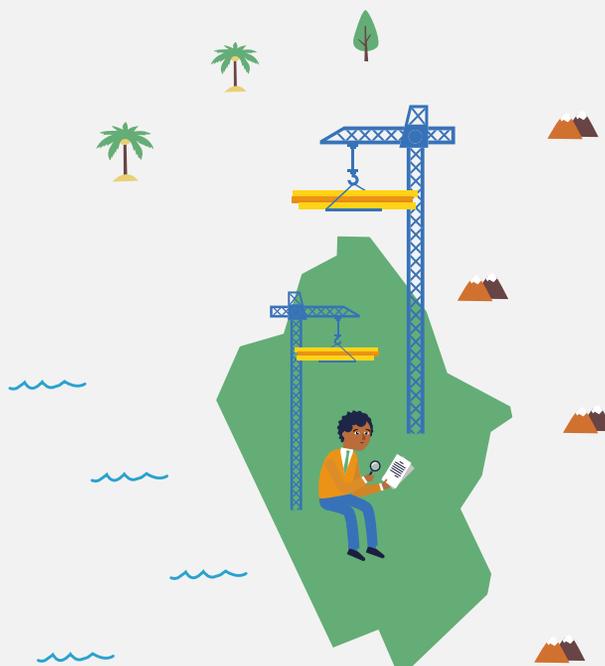

Áncash

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
CARAZ, HUAYLAS	HOSPITAL DE APOYO CARAZ	<p>Servicios afectados: atención, emergencia. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: servicios higiénicos, paredes, techos, pisos, sistema de agua y eléctrico. No han recibido atención alguna (riesgo: alto).</p>
CARHUAZ, ANTA	CENTRO DE SALUD ANTA	<p>Servicios afectados: consultorio externo, control de crecimiento y desarrollo, sala de inmunizaciones, planificación familiar, odontología, tópico, emergencia, laboratorios (hematología y bioquímica, microbiología), esterilización. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura dañada: techos, paredes, sistema de agua y drenaje, sistema eléctrico. Se han efectuado reparaciones temporales (riesgo: medio).</p>
CARHUAZ, CARHUAZ	HOSPITAL CARHUAZ	<p>Servicios afectados: emergencia, farmacia, hospitalización, sala de partos, gineco-obstetricia. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura dañada: techos, paredes, pisos. No se han efectuado reparaciones a la fecha.</p>



PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
CARHUAZ, MARCARÁ	PUESTO DE SALUD VICOS	<p>Servicios afectados: esterilización, odontología, medicina general, triaje, obstetricia, hospitalización. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: muro de contención, cerco perimétrico, paredes, techos. No se ha efectuado reparaciones (riesgo: alto para muro de contención y cerco perimétrico; medio para paredes y techos).</p> <p>Los encargados del establecimiento fueron informados que la obra se iniciaría a fines de 2018, pero hasta ahora no se ha empezado.</p>
CARHUAZ, YUNGAR	CENTRO DE SALUD YUNGAR	<p>Servicios afectados: tóxico, odontología, medicina, farmacia, cadena de frío, atención a la mujer gestante, admisión. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: pasillos, techos, cerco perimétrico, sistema de agua y drenaje, sistema eléctrico. Solo pasillos y techos han recibido una reparación temporal (riesgo: bajo para pasillos, medio para techos). Los demás daños no han sido atendidos (riesgo: alto).</p>
CASMA, CASMA	HOSPITAL CASMA	<p>Servicios e infraestructura afectada: radiología, enfermería, obstetricia, hospitalización, consultorios externos. En las áreas de radiología, enfermería y obstetricia se mejoraron techos y los equipos fueron sustituidos. Es decir, los servicios han sido restablecidos. Respecto a la infraestructura de los consultorios externos y el área de hospitalización, los daños no han sido reparados debido a que el financiamiento del Ministerio de Salud fue derivado como fondo para la construcción de un nuevo hospital.</p>

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
HUARAZ, HUARAZ	CENTRO DE SALUD NICRUPAMPA	<p>Servicios afectados: control de crecimiento y desarrollo, área de TBC, farmacia, obstetricia, oftalmología, atención a adolescentes, admisión, unidad de seguros. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura dañada: secretaría, personal, servicios higiénicos, almacén, techos, paredes, sistema de agua, drenaje pluvial, sistema eléctrico, bóvedas, patios. Reparaciones temporales se han efectuado en techos, paredes, bóvedas y patios (riesgo: medio). No se han efectuado reparaciones en el sistema de agua, drenaje pluvial y sistema eléctrico (riesgo: alto). Al ser una infraestructura antigua, el aforo es pequeño para la población que se atiende.</p>
	CENTRO DE SALUD HUARUPAMPA	<p>Servicios afectados: farmacia, medicina general, obstetricia, psicología, nutrición, enfermería, laboratorio. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: techos y paredes. Han recibido reparación temporal (riesgo: medio). Los sistemas de agua y electricidad están en riesgo de colapsar. El encargado del establecimiento conoce del presupuesto de la obra, pero no sabe cuándo se iniciará.</p>
HUARAZ, PARIACOTO	CENTRO DE SALUD PARIACOTO	<p>Servicios afectados: odontología, lavandería. Aún se encuentran parcialmente interrumpidos.</p> <p>Infraestructura afectada: depósitos, techos, ventanas, paredes, pisos. Los techos han sido reparados (riesgo: bajo). Paredes y pisos solo han recibido una reparación temporal (riesgo: medio). No se han reparado las ventanas (riesgo: alto).</p>




PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
HUARMEY, HUARMEY	HOSPITAL HUARMEY	<p>Servicios afectados: consultorios, emergencia, salas de operaciones y parto, laboratorio, rayos X. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura dañada: paredes. Han sido reparadas (riesgo: bajo).</p> <p>Debido a los graves daños causados por el Niño Costero, la atención se trasladó a un centro de salud de ESSALUD y a la IE Garcilaso de la Vega; poco a poco rehabilitaron el hospital el mismo año. Aun así, la infraestructura presenta fisuras y hay eflorescencia en muros. El mobiliario y el equipo están ubicados en un área en desuso.</p>
POMABAMBA, POMABAMBA	HOSPITAL POMABAMBA	No se encontró infraestructura dañada.
RECUAY, RECUAY	HOSPITAL RECUAY	<p>Servicios afectados: hospitalización, pediatría, sala de parto, centro quirúrgico, farmacia, esterilización, triaje, tóxico, odontología. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: servicios higiénicos, sala de espera, patio, pasillos, cerco perimétrico, sistema de drenaje, piso, bóvedas, ventanas, techos, paredes. No se ha efectuado ninguna reparación (riesgo: alto para pisos y sistema de drenaje).</p>
SANTA, CÁCERES DEL PERÚ	PUESTO DE SALUD COLCAP	<p>Servicios afectados: control de crecimiento y desarrollo, área mujer, medicina general. Todos los servicios fueron restablecidos.</p> <p>La recuperación de las áreas se realizó con presupuesto participativo aprobado por la municipalidad distrital para el año 2017. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se comprometió a construir un dique para evitar que el agua entre de nuevo, hasta la fecha no se cuenta con esta obra. Viernes y sábado se amplía la atención hasta 30 pacientes.</p>

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
SANTA, CÁCERES DEL PERÚ	PUESTO DE SALUD JIMBE	<p>Servicio afectado: emergencia. Actualmente se encuentra restablecido.</p> <p>Infraestructura afectada: sistema de agua, paredes. El sistema de agua ha recibido una reparación temporal (riesgo: alto). No se han reparado las paredes (riesgo: medio).</p> <p>El año 2017, PRONIS visitó el puesto de salud para verificar daños. Volvieron tres meses después para realizar mediciones. No han retornado hasta la fecha. La Red de Salud Pacífico Sur destinó 45 mil soles para arreglos varios. Se reparó el sistema de agua, pero volvió a fallar y permanece así. Para el servicio de emergencia compraron nuevas camillas, pintaron paredes y cambiaron puertas. Las tejas aún siguen en mal estado.</p>
SANTA, CHIMBOTE	PUESTO DE SALUD MAGDALENA	No se han iniciado obras. El funcionario encargado desconoce sobre presupuesto asignado y obras programadas.
	PUESTO DE SALUD VÍCTOR RAÚL	En 2017, PRONIS visitó el establecimiento tres veces para reparar huecos en paredes y pisos, y señalar espacios. No han vuelto desde entonces. Con el apoyo de los trabajadores, se realizó limpieza el año 2018. El Ministerio de Salud entregó 40 mil soles como reembolso.
SANTA, MORO	CENTRO DE SALUD MORO	<p>Servicios afectados: obstetricia y psicología. En el área de psicología se realizó la reparación temporal del techo y se implementó un canal de desfogue. En el área de obstetricia sólo se realizó limpieza.</p> <p>Infraestructura afectada: techos, puertas. Dos de los tres módulos de este centro de salud fueron inundados por las lluvias. Se dañaron historiales clínicos y se enmohecieron las paredes. Se efectuaron algunas reparaciones temporales, pero se observan aún fisuras en las paredes (riesgo: alto para los techos, medio para las puertas). El centro de salud no tiene cerco perimétrico.</p>



PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
SANTA, NEPEÑA	CENTRO DE SALUD SAN JACINTO	Infraestructura afectada: techos y sistema eléctrico. Las reparaciones realizadas se hicieron con el presupuesto de emergencias. Se han reparado temporalmente los techos inundados, pero manteniendo fierros expuestos (riesgo: medio). También se hicieron arreglos parciales al sistema eléctrico (riesgo: alto). La infraestructura de este centro pertenece a la Municipalidad. Esperan construir un local propio.
YUNGAY, MANCOS	CENTRO DE SALUD MANCOS	Servicios afectados: laboratorio, unidad de seguros / SIS. Los servicios han sido restablecidos. Infraestructura dañada: auditorio, servicios higiénicos, paredes, pisos, techos, sistema de agua, sistema eléctrico, muros. Sólo los muros han recibido una reparación temporal (riesgo: bajo). La jefa de la Micro Red de Salud de Mancos informó que la obra se iniciará este año.
YUNGAY, YUNGAY	HOSPITAL YUNGA	Servicios afectados: tóxico, emergencia, ecografía, sala de parto, central de esterilización, hospitalización, área de medicina, laboratorio, cocina. Todos los servicios han sido restablecidos. Infraestructura afectada: servicios higiénicos, jefatura, área de capacitación, área administrativa, sala de descanso, almacén, pasillo, patio, techos, paredes, sistema eléctrico, sistema de agua y drenaje, alcantarillado. La mayor parte de infraestructura ha recibido reparaciones temporales (riesgo: medio), salvo los sistemas de eléctricos y de agua y drenaje (riesgo: alto).

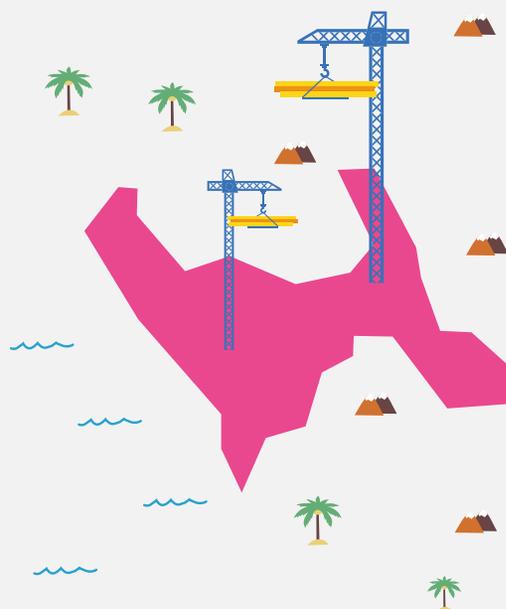

La Libertad

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
ASCOPE, CASAGRANDE	CENTRO DE SALUD CASA GRANDE	Infraestructura afectada: servicios higiénicos, bomba de agua, paredes, rejillas de piso. Solo la bomba de agua ha recibido una reparación temporal (riesgo: alto). Camas y colchones también fueron afectados; se forraron con plásticos y en las camas se acoplaron maderas.
ASCOPE, CHICAMA	CENTRO DE SALUD ALTO PERÚ	Infraestructura afectada: columnas del área de almacén, ventanas, pisos, paredes. No se han efectuado reparaciones (riesgo: alto). También se dañaron camas y colchones, y no han sido reemplazados. El director no tiene información sobre la obra a implementarse.
GRAN CHIMÚ, CASCAS	HOSPITAL DE CASCAS	Infraestructura afectada: servicios higiénicos, paredes, tanques de agua. No se han efectuado reparaciones (riesgo: alto). También se dañaron implementos de atención, camas y colchones. Los primeros han sido restablecidos, los demás no.



PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
OTUZCO, OTUZCO	PUESTO DE SALUD PANGO	<p>Servicio afectado: inmunización. Ha sido restablecido.</p> <p>Infraestructura afectada: servicios higiénicos, instalaciones eléctricas, pozo de agua. Estos daños han sido reparados.</p>
	CENTRO DE SALUD RAMÓN CASTILLA	<p>Servicios afectados: sala de espera, sala de partos, farmacia. Todos han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: techo, paredes, rejas, alcantarillado. Se han efectuado reparaciones temporales (riesgo: alto para techo y alcantarillado; medio: paredes; bajo: rejas). Las obras de mantenimiento realizadas el año 2017 no se realizaron con recursos de reconstrucción. Recibieron la visita de funcionarios del PRONIS que revisaron la infraestructura, y tomaron medidas y fotografías del área afectada.</p>
	PUESTO DE SALUD SAMNE	<p>Servicio afectado: obstetricia. El servicio se ha restablecido.</p> <p>Antes del Niño Costero, recibió apoyo para la refacción del local por parte de la ONG Cooperación y Desarrollo.</p>
SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA	CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL ANGASMARCA	<p>Servicio afectado: hospitalización. El servicio se ha restablecido.</p> <p>Infraestructura afectada: áreas de residentes y ambulancia, sistema de canaletas, techo del área de hospitalización. No se ha rehabilitado el área de residentes (riesgo: bajo), mientras que una pared del ambiente donde se encuentra la ambulancia ha recibido una reparación temporal (riesgo: alto). Se reparó el sistema de canaletas y la filtración de agua en el techo del área de hospitalización (riesgo: medio).</p>


PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
SANTIAGO DE CHUCO, CACHICADÁN	CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CACHICADÁN	Infraestructura afectada: auditorio, paredes. Ha sido reparado el techo del auditorio y las filtraciones de agua en las paredes (riesgo: bajo).
SANTIAGO DE CHUCO, QUIRUVILCA	CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL QUIRUVILCA	Servicio afectado: sala de partos. El servicio ha sido parcialmente restablecido. Infraestructura afectada: pisos, paredes, canaletas. No se han efectuado reparaciones (riesgo: medio).
PACASMAYO, SAN JOSÉ	CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ	Infraestructura afectada: servicios higiénicos, paredes del almacén. No se han efectuado reparaciones (riesgo: alto). También se afectó el mobiliario (colchones, mesas). El jefe de este establecimiento informó que existe presupuesto asignado en la Municipalidad, promovida por la gestión anterior del Centro de Salud. La visita permitió identificar la falta de un área de aislamiento para personas con TBC.

En la visita al Hospital de Cascas, su directora informó también sobre la situación del Centro de Salud El Molino, ubicado en el mismo distrito y que también fue gravemente afectado por el Niño Costero 2017, pese a lo cual no ha sido incluido en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Este establecimiento viene funcionando con el apoyo de la población y tiene limitaciones para una atención de calidad.



Lambayeque

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
CHICLAYO, CAYALTÍ	CENTRO DE SALUD CAYALTÍ	Infraestructura dañada: paredes y techos. Han recibido una reparación temporal (riesgo: medio).
CHICLAYO, LAGUNAS	CENTRO DE SALUD LAGUNAS	Infraestructura dañada: muros, techo, cerco perimétrico, instalaciones de agua, desagüe y electricidad (riesgo: alto). El personal atiende en una casa alquilada que resulta pequeña, lo que produce hacinamiento.
CHICLAYO, REQUE	CENTRO DE SALUD REQUE	Infraestructura dañada: muros y techos. Han recibido una reparación temporal (riesgo: medio). Se han realizado evaluaciones para la reconstrucción del centro de salud, pero aún no se ha iniciado la obra.
FERREÑAFE, INCAHUASI	CENTRO DE SALUD INKAWASI	Servicios afectados: psicología y laboratorio. Han sido restablecidos. Infraestructura dañada: laboratorio y residencia de personal. Han recibido reparación temporal, pero esta no es satisfactoria (riesgo: alto). El servicio de energía eléctrica no es constante.



PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
FERREÑAFE, INCAHUASI	PUESTO DE SALUD LA TRANCA	<p>Servicios afectados: obstetricia. Continúa inoperativo.</p> <p>Infraestructura dañada: servicios higiénicos (continúan fuera de servicio), sala principal y pasadizos (han recibido reparación temporal).</p>
FERREÑAFE, INCAHUASI	CENTRO DE SALUD MOYÁN	<p>Servicios afectados: obstetricia-laboratorio y admisión-triaje. Actualmente se encuentran restablecidos.</p> <p>Infraestructura dañada: tuberías. Han sido reparadas.</p>
FERREÑAFE, INCAHUASI	PUESTO DE SALUD PUCHACA	<p>Infraestructura dañada: pared posterior. Ha recibido una reparación temporal (riesgo: alto).</p>
LAMBAYEQUE, SALAS	CENTRO DE SALUD SALAS	<p>Servicios afectados: maternidad, consultorio de TBC y área del grupo eléctrico. Todos ellos continúan parcialmente interrumpidos.</p> <p>Infraestructura dañada: techos de calamina, paredes con filtraciones de agua. Además, el grupo eléctrico se encuentra en una pendiente de inundación de agua. Se han realizado algunas mejoras con recursos propios del establecimiento.</p>



Piura

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
MORROPÓN, SALITRAL	CENTRO DE SALUD SALITRAL	<p>Servicios afectados: sala de espera, internamiento, almacén, tóxico. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: techos, paredes, losa, red de agua y desagüe. La infraestructura dañada ha recibido reparaciones temporales (riesgo: medio).</p>
HUANCABAMBA, SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	CENTRO DE SALUD EL FAIQUE	<p>Servicios afectados: sala de partos, sala de dilatación, sala de esterilización, salas de recuperación de adultos, sala de hospitalización de niños y niñas, odontología. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: paredes, techos. No han sido reparados (riesgo: alto).</p>




PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
PIURA, CASTILLA	CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL CASTILLA	<p>Servicios afectados: todas las áreas de atención. En la actualidad, los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: Las instalaciones se encuentran muy deterioradas, solo se han efectuado reparaciones temporales (riesgo: alto). Se trata de infraestructura con más de 70 años de antigüedad.</p>
PIURA, LA UNIÓN	CENTRO DE SALUD LA UNIÓN	<p>Servicios afectados: hospitalización, sala de operaciones, farmacia, enfermería, sala de partos, consultorios. Todos los servicios han sido restablecidos.</p> <p>Infraestructura afectada: desagüe, instalaciones eléctricas, paredes con filtraciones de agua. El desagüe no ha sido reparado (riesgo: alto). Los demás daños han sido atendidos (riesgo alto: filtraciones de agua; riesgo medio: instalaciones eléctricas).</p>




Tumbes

PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
TUMBES, TUMBES	HOSPITAL SAÚL GARRIDO ROSILLO	En este establecimiento se ha sido instalado el Hospital Regional (reubicado por temas judiciales y condiciones). Aun no hay obras en ejecución. El administrador no brindó información sobre servicios afectados e infraestructura dañada.
CONTRALMIRANTE VILLAR, ZORRITOS	PUESTO DE SALUD BOCAPÁN	Servicios afectados: admisión, farmacia (deterioro de medicamentos), obstetricia y medicina general. Todos han sido restablecidos. Infraestructura afectada: canaletas del techo e instalaciones eléctricas. Han recibido reparación temporal (riesgo: medio). No se cuenta con acondicionamiento de áreas para una buena atención, los espacios son reducidos.
CONTRALMIRANTE VILLAR, CASITAS	PUESTO DE SALUD TRIGAL	Infraestructura afectada: filtraciones de agua en paredes y subsuelo, y rajaduras internas en paredes (riesgo: medio).



PROVINCIA Y DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	OBSERVACIONES
CONTRALMIRANTE VILLAR, CANOAS DE PUNTA SAL	PUESTO DE SALUD BARRANCOS	<p>Servicios afectados: admisión. Ha sido restablecido.</p> <p>Infraestructura afectada: sistema de drenaje y techo. El primero ha sido restaurado, pero el segundo solo ha recibido una reparación temporal. Este año se realizó un servicio de mantenimiento, el cual ha tenido observaciones aún no subsanadas.</p>
ZARUMILLA, ZARUMILLA	CENTRO DE SALUD ZARUMILLA	<p>Servicios afectados: emergencia, consultorios, farmacia. Todos ellos continúan interrumpidos.</p> <p>Infraestructura afectada: baños, paredes, columnas, pisos y techos. Todos han sido temporalmente reparados, salvo los baños que permanecen inoperativos (riesgo: alto). La obra está abandonada, sin medidas de seguridad y judicializada.</p>

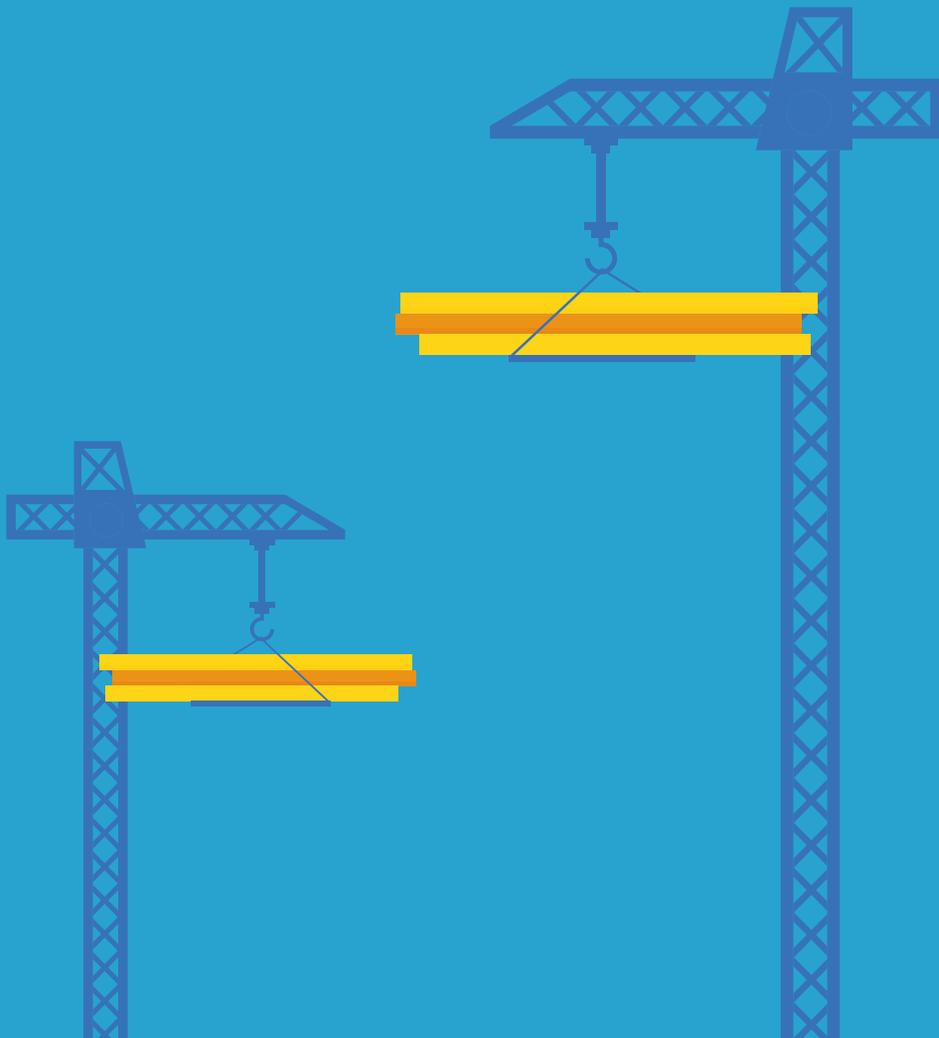

La elaboración de este reporte fue realizado por el Observatorio de Integridad, gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad del Observatorio de Integridad y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.

